

Informácia o aktuálnom stave výstavby projektu „CYCLOMOST II“ a o súčasnom stave prípravy k cestnému mostu Záhorská Ves - Argern

Projekt CYCLOMOST II

Zhotoviteľ: Združenie Cyklomost INGSTEEL & Doprastav

Podpis zmluvy o dielo: 22.9.2011

Cena diela je 3 107 398,94 € s DPH (cena zahŕňa nájazd na most na slovenskej strane a náklady na oceľový most, ktoré sú rozdelené v pomere podľa štátnej hranice: 62,86% na slovenskej a 37,14% na rakúskej strane).

Termín realizácie (predpokladaný): 30.9.2011 – 30.5.2012

- začatie výstavby na **slovenskej strane** 30.9.2011 – **stav k 2.11.2011:**
 1. prebiehajú práce na realizačnom projekte,
 2. zriadenie staveniska,



3. vykonaný výrub stromov



4. prebiehajú práce na príjazdovej komunikácii až ku rieke Morava



5. prebieha vŕtanie mikropilót




- na **rakúskej strane** odovzdané stavenisko 6.10.2011 a začatie stavebných prác 28.10.2011 – **stav k 2.11.2011**:
 1. vytýčenie nového obvodu staveniska (zväčšenie v zmysle požiadavky Zhotoviteľa, na základe využitia stavebných strojov s väčšími priestorovými nárokmi)
 2. prebieha vŕtanie mikropilót

Práce prebiehajú podľa harmonogramu.

Cestný most Záhorská Ves - Angern

Letecký pohľad

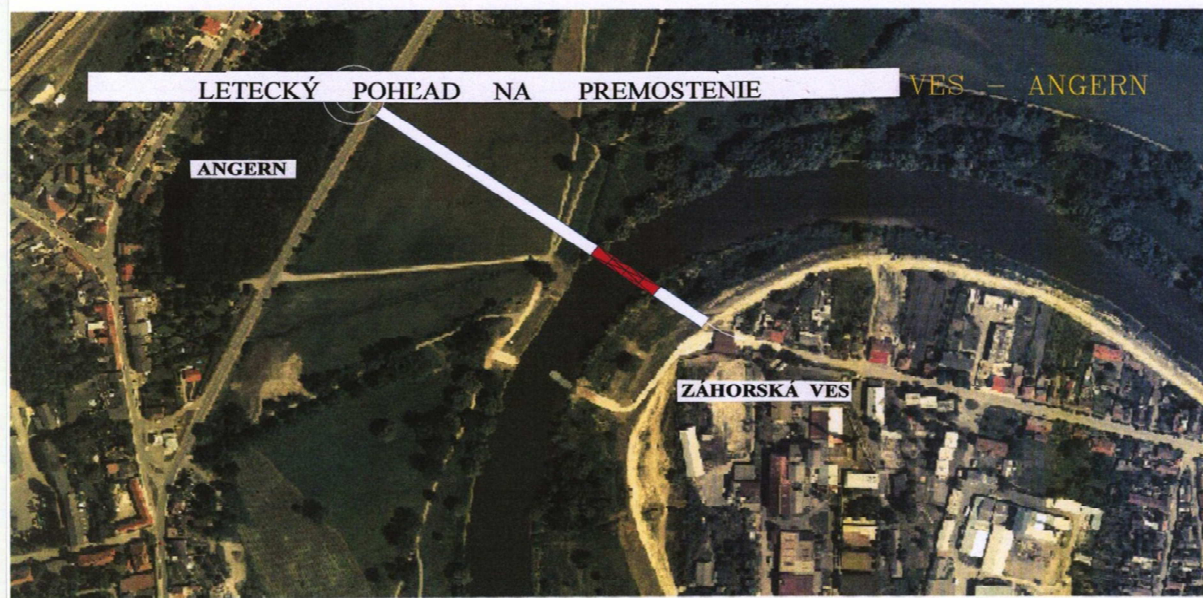

Maketa mosta

